Kompaktrapport

Energirapport

Juni 2018 - Juni 2018

Udarbejdet 31-07-2018

A/B Lollandsvej 35 - 39
Lollandsvej 35
Postkasse i opgang
2000 Frederiksberg

Lollandsvej 35 - 39
2000 Frederiksberg

Sag nr.: 4776
Energikonsulent: Janne Frederiksen/(ICMO)

	Fjernvarme [MWh]					Elektricitet [kWh]			Vand [m³]		
Periode	**Budget**	**Kor. budget**	**Forbrug**	**Afvigelse %**	**Afkøling**	**Budget**	**Forbrug**	**Afvigelse %**	**Budget**	**Forbrug**	**Afvigelse %**
2018 jun.	7,42	5,04	4,23	16,1 •	36,3 °C	666,67	402,87	39,6 •	150,00	120,75	19,5 •
2018 jul.	5,74					666,67			150,00		
2018 aug.	5,55					666,67			150,00		
2018 sep.	8,97					666,67			150,00		
2018 okt.	14,39					666,67			150,00		
2018 nov.	20,65					666,67			150,00		
2018 dec.	26,26					666,67			150,00		
2019 jan.	28,97					666,67			150,00		
2019 feb.	27,43					666,67			150,00		
2019 mar.	25,46					666,67			150,00		
2019 apr.	19,25					666,67			150,00		
2019 maj	11,91					666,67			150,00		
Total	7,42	5,04	4,23	16,1 •	36,3 °C	666,67	402,87	39,6 •	150,00	120,75	19,5 •
Prognose	202,00	199,62	198,81	0,4 •		8.000,00	7.736,21	3,3 •	1.800,00	1.770,75	1,6 •
/ m²	120,38	118,96	118,48			3,97	3,84		0,89	0,88	

Farveindikationer på afvigelser er givet i forhold til en grænse på ± 10%

Fjernvarme

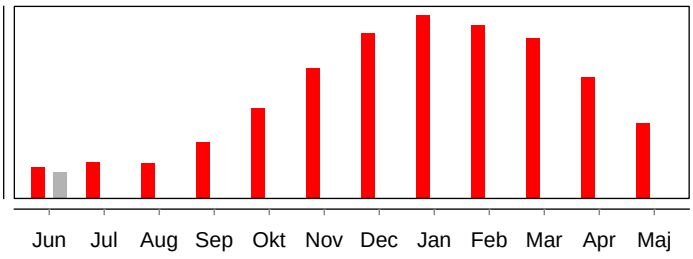

Afkøling

Afkølingen til højre viser den gennemsnitslige afkøling i perioden samt leverandørens krav

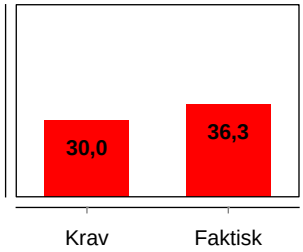

Elektricitet

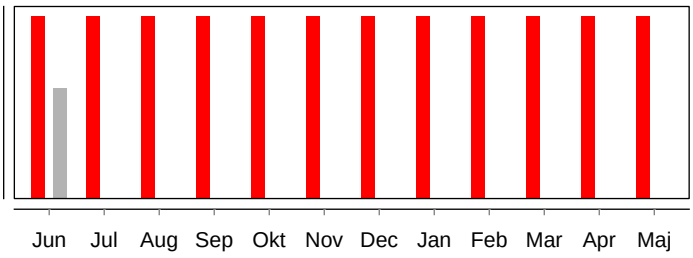

Vand

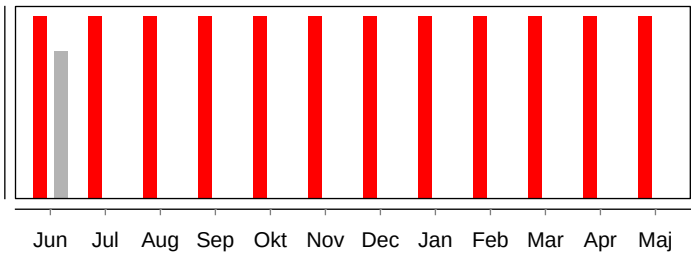

Budget Forbrug

Kompaktrapport

Økonomirapport

Juni 2018 - Juni 2018

Udarbejdet 31-07-2018

Priser	**Budget**	**Aktuel**
Fjernvarme	285,35	285,35
Fast andel	3189,35	3189,35
Elektricitet	2,20	2,20
Vand	35,33	35,33

Lollandsvej 35 - 39
2000 Frederiksberg

Sag nr.: 4776
Energikonsulent: Janne Frederiksen/(ICMO)

Alle priser er i kr inklusiv moms.

	Fjernvarme			**Elektricitet**			**Vand**		
Periode	**Budget**	**Forbrug**	**Besparelse**	**Budget**	**Forbrug**	**Besparelse**	**Budget**	**Forbrug**	**Besparelse**
2018 jun.	5.307,81	4.395,67	17,2 •	1.466,67	886,32	39,6 •	5.298,75	4.265,58	19,5 •
2018 jul.	4.918,81			1.466,67			5.298,75		
2018 aug.	4.866,38			1.466,67			5.298,75		
2018 sep.	6.148,92			1.466,67			5.298,75		
2018 okt.	8.929,00			1.466,67			5.298,75		
2018 nov.	12.628,62			1.466,67			5.298,75		
2018 dec.	16.629,15			1.466,67			5.298,75		
2019 jan.	18.005,57			1.466,67			5.298,75		
2019 feb.	16.903,50			1.466,67			5.298,75		
2019 mar.	16.225,72			1.466,67			5.298,75		
2019 apr.	12.963,14			1.466,67			5.298,75		
2019 maj	9.343,63			1.466,67			5.298,75		
Total	5.307,81	4.395,67	17,2 •	1.466,67	886,32	39,6 •	5.298,75	4.265,58	19,5 •
Prognose	132.870,26	131.958,12	0,7 •	17.600,00	17.019,65	3,3 •	63.585,00	62.551,83	1,6 •
kr/m²	79,18	78,64		8,73	8,44		31,54	31,03	

Farveindikationer på afvigelser er givet i forhold til en grænse på ± 10%

Afkøling pr. 30. juni 2018

Målt gennemsnit	36,3 °C
Øvre/nedre grænser fra værket	30,0/30,0 °C
Forbrug	4,23 MWh
Bonus	0,00 kr

31.07.18
Hermed fremsendes energistyringsrapport for juni 2018.
Forbrug ligger alle med gode besparelser i forhold til budgettet
Den gennemsnitlige afkøling ligger fint i forhold til krav fra værk.
Det er en fordel at sommerlukke for varmekredsen på FJV af hensyn til den årlige gennemsnitlige afkøling.
Med venlig hilsen
Janne Frederiksen
jahf@kubenman.dk
